



CoDev Timetracking

Le suivi d'activité avec Mantis

06 Juillet 2011

Fonctionnalités

CoDevTT s'appuie sur Mantis pour gérer l'avancement du projet

- Saisie des CRA
- Rapports d'activité
- Suivi détaillé des tâches
- Levées d'alertes
- Planning
- Indicateurs de productivité
- Statistiques

Activité hebdomadaire

Équipe: PROSYS Semaine: W14 | 04 Apr - 08 Apr 2011

Anne charge = 2

Fiche	Projet	Poste	Lundi 04 Apr	Mardi 05 Apr	Mercredi 06 Apr	Jeudi 07 Apr	Vendredi 08 Apr
532 / tcp1b1_43865 : [Incognito] Intégration du jeu Incognito dans la valo afficheur caisse en INTEGRATION	Incognito	Analyse de l'existant					0.5
522 / tcp1b1_44221 : [ROMA] Erreur information afficheur caisse	ROMA	Analyse de l'existant	1		1		0.5
62 / : Reunion (generique)	SuiviOp PROSYS	N/A		0.1		0.1	
63 / : Problème de connexion session Windows (generique)	SuiviOp PROSYS	N/A				0.4	
524 / 375 : [AMIGO 1.3] Partie Stats	AMIGO 3	Developpement				0.5	
484 / tcp1b1_43827 : [Valorisation Gagnants - ROMA] Absence de la variable associée au pays	ROMA	Analyse de l'existant		0.9			

Carole charge = 2.8

Fiche	Projet	Poste	Lundi 04 Apr	Mardi 05 Apr	Mercredi 06 Apr	Jeudi 07 Apr	Vendredi 08 Apr
60 / : Absence	SuiviOp PROSYS	N/A	1		1		
62 / : Reunion (generique)	SuiviOp PROSYS	N/A		0.1			
106 / : Documentation	SuiviOp PROSYS	N/A		0.9			
535 / 375 : [AMIGO 1.3] Tests d'ensemble	AMIGO 3	Documentation				1	0.5
485 / : Workshop Mixen	SuiviOp PROSYS	N/A					0.5

Jessica charge = 0

Fiche	Projet	Poste	Lundi 04 Apr	Mardi 05 Apr	Mercredi 06 Apr	Jeudi 07 Apr	Vendredi 08 Apr
62 / : Reunion (generique)	SuiviOp PROSYS	N/A		0.1			
106 / : Documentation	SuiviOp PROSYS	N/A	1	0.9	1	1	1

Existant

Des tâches récurrentes et laborieuses

► Suivi des tâches

- Le chef de projet va à la pêche aux informations
- Le CRA hebdomadaire (feuille XLS) manque de granularité
- Difficulté à évaluer les axes d'amélioration de l'équipe
- Pas de lien entre les outils de dev et les outils de gestion de projet

► Rapports hebdo/mensuels

- Calcul d'indicateurs de production
- Création de graphiques
- Synthèse des points difficiles et de l'avancement

Expression du besoin

Spontanéité de l'information et automatisation des tâches

- Faciliter la saisie des CRA
- Informer dès que possible sur l'avancement des tâches (et non en fin de semaine)
- Lever des alertes
- Générer des infos pour les rapports client

Respect des délais de livraison (100.0%)

	Total	Fiches	Formule
Fiches NON livrées à temps.	0	(0)	DeliveryDate > DeadLine
Fiches livrées à temps.	1	(0) 608	DeliveryDate <= DeadLine

Dérives - Résolues dans la période

	ETA	EffortEstim (BI + BS)	Description
Dérive	4.25	5.75	Nbre de jours de dépassement par rapport. - Le calcul est fait sur les fiches Résolues/Fe - Les fiches réouvertes ne sont pas comptabilisées - Si négatif, avance sur le planing.
Fiches en dérive	2 (13.6)	(10.6) 608 , 534	
Fiches à l'équilibre	1 (-0.5)	1 (0)	Fiches résolues dans les temps.
Fiches en avance	1 (-8.85)	1 (-4.85) 652	


Dérives - En cours à ce jour

	ETA	EffortEstim (BI + BS)	Description
Dérive	3.10	11.10	Nbre de jours de dépassement par rapport. - Le calcul est fait sur les fiches NON Résolues
Fiches en dérive	7 (30.55)	5 (11.25) 553 , 468 , 458 , 284 , 261	
Fiches à l'équilibre	12 (-6.45)	19 (1.35)	Fiches résolues dans les temps.
Fiches en avance	6 (-21)	1 (-1.5) 630	

Fonctionnement global

La gestion du temps en plus

- ▶ Mantis pour suivre toutes les tâches quotidiennes
 - Anomalies
 - Tâches de développement
 - Tâches 'annexes' (Suivi Op, Outils, Incidents, Absences, Astreintes, Support, etc.)
- ▶ Ajouter la notion de temps aux fiches Mantis
 - Budget initial (nbre de jours)
 - Reste à faire
 - Date Jalon (deadline)
 - Date de livraison

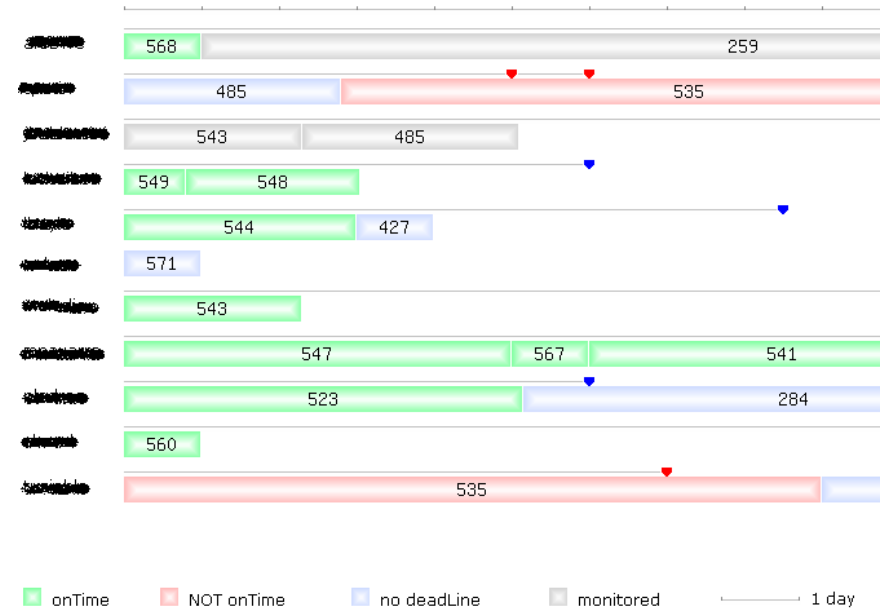

Mise en œuvre

Customisation de Mantis

- ▶ Saisie des CRA basée sur les tâches Mantis
- ▶ Utilisation du workflow de mantis
- ▶ Ajout de champs dans les fiches mantis pour permettre le suivi dans le temps
- ▶ Ajout d'un projet 'SuiviOp' regroupant toutes les tâches annexes
- ▶ creation d'un module dédié au suivi des fiches, planning, statistiques, rapports.

Projets de SuiviOp

☒ Ajouter le projet de SuiviOp commun *

☒ Créer un projet de SuiviOp Spécifique

• **Nom du Projet** *

• **Catégories**

☐ Inactivité

☒ Gestion de Projet * (Réunion, Avant-vente, Suivi de projet, ...)

☒ Incident (Serveur inaccessible, ...)

☒ Outillage (Admin Sys, Scripts, ...)

☒ Capitalisation (Support, Doc, Formation, Wiki, ...)

• **Champs personnalisés**

☒ Champs CoDev * (BI, BS, RAE, DeadLine, Date de Livraison)

• **Taches de SuiviOp**

☒ Gestion de Projet

☒ Gestion de Projet

☐ Incident

☐ Outillage

☐ Capitalisation

Points abordés pendant la démonstration

- April 2011

[illegible]

May 2011

May 2011	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
05/01/2011										1		0.5						1						1	1							
05/02/2011										1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	
05/03/2011			1	1	1	1			1	1	1	1	1			0.5								1	1	1	1	1			1	1
05/04/2011					0.5	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	
05/05/2011			1	0.5							1						0.2	1	1	1	1					1	0.5					
05/06/2011									1											1							0.5	1				
05/07/2011																								1	1	1	1	1				
05/08/2011				1							1							1								1						
05/09/2011						1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1							
05/10/2011						1			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			1	1	1							

June 2011

[illegible]

Adapter CodevTT à la CNMSS

► Adapter

- Migration de MANTIS v1.1.8 vers MANTIS v1.2.X
- Intégrer les indicateurs cités dans la Convention de Service

► Déployer

- Migrer MANTIS pour l'ensemble du service
ou
- Créer une nouvelle instance de MANTIS

Et après ?

CodevTT est en constante évolution

► Standardisation

- Terminologie
- Indicateurs issus du « GDP Mesurment Catalogue »

► Fonctionnalités

- Seuils d'alertes configurables pour les indicateurs (min, max, alerte)
- Personnalisation (choix des indicateurs, seuils, langues, etc)
- Gestion de la dépendance des tâches
- Visibilité du champ ETA (manager=oui, developers=non)
- Meilleure gestion des entrées/sorties dans une équipe
- Interface + sexy (HTML5)

Merci

Contact:

Louis BAYLE

Tel: 04 42 60 47 00

lbayle.work@gmail.com

[Http://codevtt.org](http://codevtt.org)

Atos

200 Rue Pierre Duhem

13100 Aix-en-Provence

www.atos.net

Atos, the Atos logo, Atos Consulting, Atos Worldline, Atos Sphere, Atos Cloud, Atos WorldGrid are registered trademarks of Atos SA. July 2011

© 2011 Atos. Confidential information owned by Atos, to be used by the recipient only. This document, or any part of it, may not be reproduced, copied, circulated and/or distributed nor quoted without prior written approval from Atos.

Your business technologists. **Powering progress**

© Confidential

